

Nr 11
2019-10-28

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Nu går vi in i en ny fas. Där Tornkranen börjar monteras mitt på den blivande innergården. Spännande! Den kommer vi rätt så hög, och kommer att ha en kranarm på ca 55 meter.

Vi fortsätter annars med utlastning av de sista bergsmassorna i Hus 2 och en del övriga markarbeten nere vid Hus 5 och vid Hus 1.

Betongarbetena fortlöper med grundsulor, fundament osv i Hus 4.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt


Vecka 44



1. Yttre/inre VA för Hus 4 och 3
2. Utfyllning vid Hus 1
3. Grundarbeten, Hus 4
4. Montage Tornkran

Bemanning:

Platsledning, Markarbeten,
Betongarbeten i grund, Rörarbeten,
Montörer kran

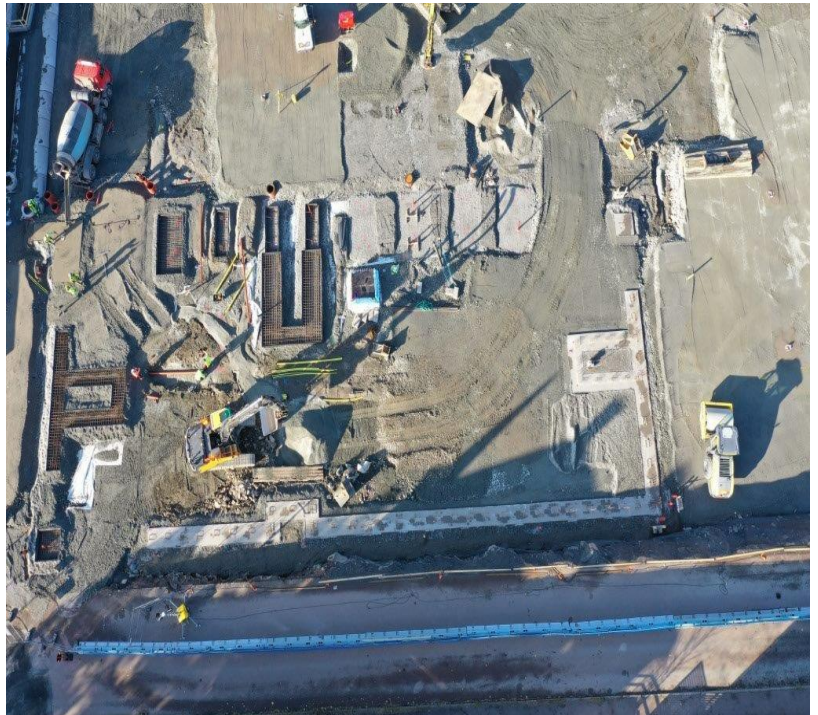

Drönbild över grundsulor & fundament Hus 4
