

# Veckobrev v.24

## Kv.Hjorten

### Arvikas Nya Högstadium

Ansvarig utgivare:  
Helena Araujo  
Projektadministratör  
Serneke Sverige AB



Hej!


- Hus 2: Montage av fönster snart klart. Arbete med isolering, plast- och träregel och skenor i tak. Montage fläktrum och spackling av golv (på Plan 10).
- Hus 3: Montage av tak och utfackningsväggar.
- Hus 4: Pågående arbeten med innerväggar, ventilation, el och vs. Hissmontage
- Hus 5: Montage av stomme och väggar.
- Skolgård Centralskolan: Arbete med fjärrvärme pågår.



Matsalen börjar ta form



Ställverk i källaren Hus 2

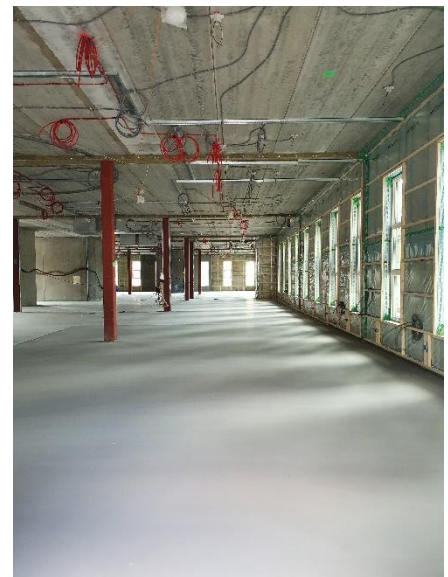

Nyspacklat golv Plan 10 Hus 2

#### **Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Vent, Kranförare, Ställning, Bygg, Plåtslagare, Takpappläggare, Innerväggsmontörer och Brandisolerare.
