

Nr 5  
2020-02-03

## Veckobrev

### Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:  
Anders Vikström  
Platschef Serneke



Hej!

I Hus 2 så gjuts den sista källarväggen. Sen påbörjas skyddsrumsbjälklaget att formas och armeras och göras klart för gjutning. Pelarna i källaren är också gjutna nu. Tätskikt på kantbalken är nästan klart, och vi har börjat att montera podrän och återfyllning har påbörjats runt huset. Prefabmontage av väggar och HDF drar igång nu.

På Hus 1 så har vi gjutit klart några fler fundament och kantbalk. Dessa arbeten fortlöper.

Markarbeten för Hus 3 är nu påbörjade, och vi börjar betong och grundarbeten för hissgruppen direkt. Även några av fundamenten tas med nu i Hus 3.

I Hus 4 så fortsätter vi med utfackningsväggar och även brandisolering kör vi vidare med. Takarbeten startas upp med montage av takstolar osv. Prefabmontaget färdigställs och loftgångar monteras.

### Vecka 6



1. Fundament och kantelement i Hus 1.
2. Formning & armering av bjälklag över skyddsrum & gjutning av sista källarväggen Hus 2.
2. Återfyllning och podrän. Prefabmontage i Hus 2 startar.
3. Prefab Hus 4 och utfackningsväggar samt takarbeten.
4. Markarbeten och grundarbeten startar i Hus 3.


**Bemanning:**

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Ställning, Bygg, Brandisolering.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.



Hus 1 förbereds för gjutning av bottenplattan.

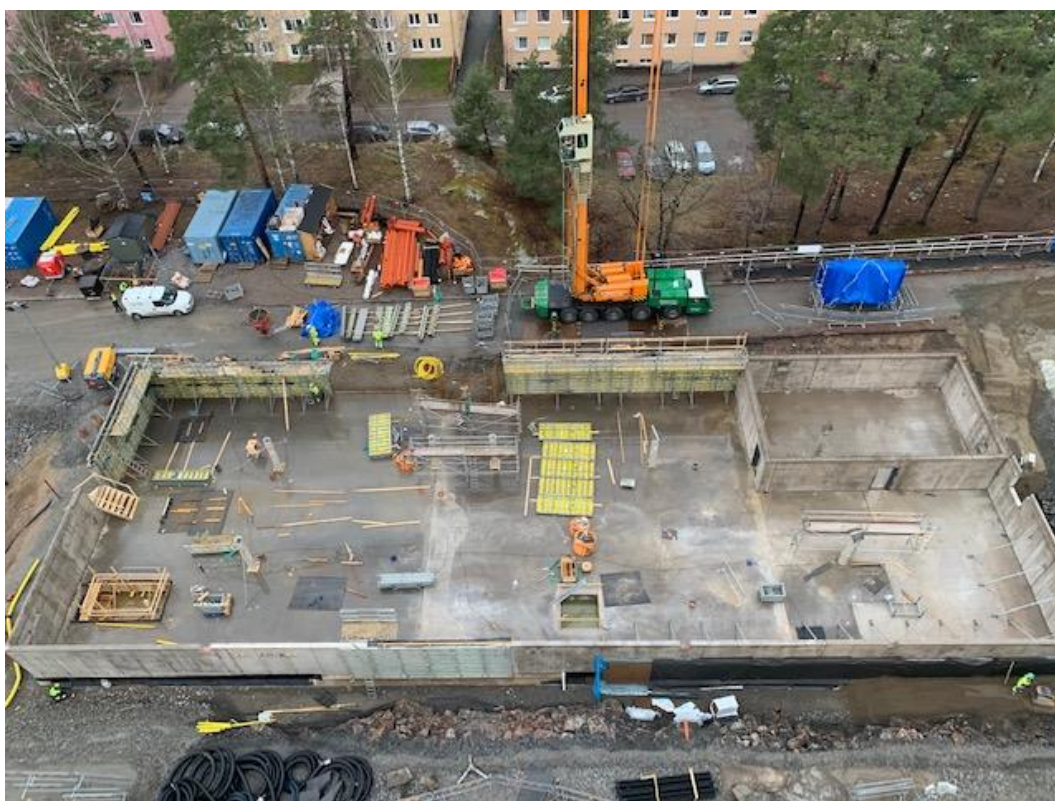

Hus 2, källarväggar och skyddsrum.
